



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตุสิต

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลตุสิต

อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้ต
จัดทให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดู่สิต ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปแล้ว จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต. ดู่สิต ดังนี้

๑) วิสัยทัศน์

“ตำบลดู่สิตสะอาด สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตดี ประเพณีเด่น เน้นธรรมาภิบาล
ภายในปี ๗๐”

๒) พันธกิจ

๑. พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
๒. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓. พัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
๔. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
๖. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๗. พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

๓) ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง และการควบคุมอาคาร
๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การบริหารจัดการองค์กร

๔) เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขปีโรค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง ระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลก มีอาชีพ มีรายได้ พอเพียง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
๓. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการทำนุบำรุง
๔. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
๕. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๕) เป้าหมาย และ ตัวชี้วัด

๑. การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล
๒. ระบบสาธารณสุขปีโรค สาธารณูปการมีคุณภาพและให้บริการทั่วถึง
๓. มีการดำเนินการระบบผังเมืองและอาคารครอบคลุมทั้งตำบล
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในภาพรวมของตำบล
๖. มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของตำบลเพิ่มขึ้น
๗. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรุ่นสู่รุ่น
๘. มีการปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
๙. ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมลดลง
๑๐. การจัดเก็บภาษีในตำบลได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๑๑. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาบรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งเมืองและการควบคุมอาคาร	66	2,102,000	80	293,661,800	80	296,065,700	83	327,180,400	85	321,971,000	394	1,240,980,900
การพัฒนาต้นน้ำลำธารและคุณภาพชีวิต	50	25,424,600	50	25,374,600	50	25,424,600	50	25,374,600	50	25,424,600	200	101,598,400
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	14	1,405,000	14	1,405,000	14	1,405,000	14	1,405,000	14	1,405,000	70	7,025,000
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	18,285,000	11	18,285,000	13	23,285,000	16	24,498,300	17	25,298,300	69	109,651,600
การบริหารจัดการองค์กร	12	958,000	12	958,000	12	958,000	12	958,000	12	958,000	60	4,790,000
รวม	154	48,174,600	167	339,648,400	169	347,138,300	175	379,416,300	178	375,056,900	793	1,464,045,900

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุสิต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,845,000 บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ฟังเมืองและการควบคุมอาคาร		
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต		
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น		
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
การบริหารจัดการองค์กร		
รวม		

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกเคียน - เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 8 ตำบลดุสิต อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร ทนน้ำเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหลทาง 2 ซ้ำ กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พื้นทางเดิม SCARYFI (ซูร์ริอ) ผิวดินลึกลับ 0.10 เมตร ปรับเปลี่ยนแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 1-1.80 x 1.80 ความยาว 8.00 เมตร ทำมุมกับแนวก่อสร้าง จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต กำหนด	949,000 (ข้อบัญญัติ 69)	1 ต.ค.68	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลดุสิต อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 1-1.80 - x 1.80 เมตร ความยาว 7.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต กำหนด	229,000 (ข้อบัญญัติ 69)	1 ต.ค.68	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
3	โครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก - แยกทางรถไฟสาย 41 - แยกทางรถไฟสาย 9	โครงการซ่อม / สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41 - หนองนางไหล หมู่ที่ 9 ตำบลคูสิด อำเภอดำพระมิตร จังหวัด นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมหินคลุก โทลทาง 2 ชั้น กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ทางเดิม SCARIFY (ซูตริโอ) ผิว ดินลิก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY รายละเอียดตามแบบแปลน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด	489,000 (ข้อบัญญัติ 69)	1 ต.ค.68	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกศาลาหมู่ที่ 9 - แยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลคูสิด อำเภอดำพระมิตร จังหวัด นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกโหลทาง 2 ชั้น กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตรารวมเมตร พื้นที่ทางเดิม SCARYFI (ซูตริโอ) ผิวดินลิก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอหาด	โครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยก ศาลาหมู่ที่ 9 แยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลคูสิด อำเภอดำพระมิตร จังหวัด นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกโหลทาง 2 ชั้น กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตรารวมเมตร พื้นที่ทางเดิม SCARYFI (ซูตริโอ) ผิวดินลิก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอหาด	486,000 (ข้อบัญญัติ 69)	1 ต.ค.68	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รร.สวนพิกุล - บ้านหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลคูสิด อำเภอดำพระมิตร จังหวัด นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกโหลทาง 2 ชั้น กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตรารวมเมตร พื้นที่ทางเดิม SCARYFI (ซูตริโอ) ผิวดินลิก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอหาด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รร.สวนพิกุล - บ้านหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลคูสิด อำเภอดำพระมิตร จังหวัด นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกโหลทาง 2 ชั้น กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตรารวมเมตร พื้นที่ทางเดิม SCARYFI (ซูตริโอ) ผิวดินลิก 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอหาด	486,000 (ข้อบัญญัติ 69)	1 ต.ค.68	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
		รวม	2,639,000				-		

ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม ที่ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือสิต มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตสุราษฎร์ธานี - บ้านนายเสนอ ไชยรัตน์ หมู่ที่ 10	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	498,300 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พล.41 - เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 4	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 152.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางที่ปลูกเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร	421,400 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกอมทรัพย์ หมู่ที่ 3 - เกาะลอยน้ำ ชุด หมู่ที่ 3	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางที่ปลูกเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	485,100 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	437,800	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก พล.41-ทุ่งกบ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	486,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	285,500	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านควนจำปา - แยกหนองจิก หมู่ที่ 8	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โพล์ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	485,100 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	437,800	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านจันเคือ - แยกคลองน้ำดำ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทางยาว 145.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โพล์ทางตามสภาพหรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 507.50 ตารางเมตร	334,800 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,500	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายชำนาญ อ่อนรัตน์ - แยกสะพานโคกบ้านฝ้าย หมู่ที่ 3,6	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โพล์ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	486,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	437,800	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงเรียนพรพรพรพลเขต - บ้านนาอีระแสงระวี หมู่ที่ 11	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โพล์ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	416,200 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	375,600	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสวนพืชร - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โพล์ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	486,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
10	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิกสายบ้านคลองเต - คลองเตี หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนบุกเบิกผิวจราจรหินลู บดทับ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร	490,800 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิกสายบ้านวังปริง - แยกโคกเทวี หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนบุกเบิกผิวจราจรหินลู บดทับ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	375,400 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล.สายแยกเกาะ ขวัญ - บ้านช่องไทร หมู่ที่ 2	ก่อสร้างตั้งนี้ - งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ ขนาด กว้าง 1-1.8 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน 1 จุด - ผิวจราจรช่วงที่ (1) กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า 50.00 ตารางเมตร - ผิวจราจรช่วงที่ (2) กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า 50.00 ตารางเมตร - รวมระยะทางดำเนินการ 20.00 เมตร หรือพื้นที่จราจร รวมไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร	291,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการซ่อม/สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกาะขวัญ - คลองกา หมู่ที่ 7	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร	70,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	63,000	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าโรงเรียนวัดสวนพิบูล - บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 6	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	421,400 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
15	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองรูปตัวยู ขนาดทรงระบายน้ำ ยาว 303.00 เมตร บำรุงกว้าง 0.80 เมตร ท้ายราง กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดทางรถผ่าน จำนวน 2 แห่ง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองรูปตัวยู ขนาดทรงระบายน้ำ ยาว 303.00 เมตร บำรุงกว้าง 0.80 เมตร ท้ายราง กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดทางรถผ่าน จำนวน 2 แห่ง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร	359,000 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
16	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองรูปตัวยู หมู่ที่ 6,3 แยกโคกเป็นฝาย - แยกกลุ่มออมทรัพย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองรูปตัวยู ขนาดทรงระบายน้ำ ยาว 144.00 เมตร กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมฝาปิดทางรถผ่าน จำนวน 3 แห่ง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร	274,000 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านโคกเคียน สายโคกเคียน - เขตสุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองรูปตัวยู ขนาดทรงระบายน้ำ ยาว 180.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.57 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 360 ผา ขนาดกว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร	462,200 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านโคกเคียน - เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร	83,700 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	72,900	ไม่มี	ไม่มี
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41- แยกบ้านนายพัน รักษาภัย หมู่ที่ 2	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	485,100 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	437,000	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
20	โครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทด.41 – แยกบ้านเบ็ญจวรรณ หมู่ที่ 2	<p>เปิดขุด (ช่วงที่ 1) กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 45.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร โทล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร</p> <p>- เปิดขุด (ช่วงที่ 2) กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 20.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร โทล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร</p> <p>- เปิดขุด (ช่วงที่ 3) กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร โทล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร</p> <p>รวมระยะทางดำเนินการ 125.00 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร</p>	485,100 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	397,000	ไม่มี	ไม่มี
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนาบประสิทธิ์ – สระน้ำอนุสาวรีย์ หมู่ที่ 2	<p>ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร โทล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร</p>	485,100 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	437,000	ไม่มี	ไม่มี
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกศาลาหมู่ที่ 7 - แยกบ้านนายสมเ็จ ยะโส หมู่ที่ 7	<p>ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร โทล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร</p>	485,100 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	434,000	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41 - บ้านนายเวียง ชูโลก หมู่ที่ 9	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	471,500 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	424,900	ไม่มี	ไม่มี
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกศาลาหมู่ที่ 9 - แยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	485,100 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	437,000	ไม่มี	ไม่มี
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคันทจิก - หินน้ำออก หมู่ที่ 9,2	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร	443,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	400,000	ไม่มี	ไม่มี
26	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู สายบ้านนายประทีป ปรุราช - เขตสุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขนาดรางระบายน้ำ ยาว 199.00 เมตร กว้าง 0.80 เมตร สูง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร	463,400 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	428,000	ไม่มี	ไม่มี
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกวัดวังริบุญเลิศ - แยกหน้า อบต.ดุดี หมู่ที่ 5	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	486,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	434,000	ไม่มี	ไม่มี
28	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านเกาะขวัญ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรุ 6 นิ้ว(150 มม.) ลึก 80 เมตร หรือต้องได้ปริมาณ น้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. หรือเมตรคอนกรีตปริมาตรปากบ่อบ่อบาดาลกว้าง 1.50 x 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า และตู้ควบคุมไฟฟ้า	247,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	31 พ.ค.68	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
29	โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นสายแยก ทล.41 - แยกหน้าวัดวังบุญเลิศ หมู่ที่ 5,7	- ขยายผิวจราจร(ช่วงที่ 1) กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาว 440.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ใต้สะพานตามสภาพ หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร - ขยายผิวจราจร(ช่วงที่ 2) กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาว 440.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ใต้สะพานตามสภาพ หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 880.00 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.	315,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	31 พ.ค.68	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	283,000	ไม่มี	ไม่มี
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกวัดวังบุญเลิศ - แยก ทล.41 หมู่ที่ 7	ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	486,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	434,000	ไม่มี	ไม่มี
31	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านคลองกา	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรู 6 นิ้ว(150 มม.) ลึก 80 เมตร หรือต้องได้ปริมาณ น้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.พร้อมเทคอนกรีตบริเวณปากบ่อขนาดกว้าง 1.50 x 1.50 เมตร ทน0.15 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซีเมนต์ 2 แรงม้า และตู้ควบคุมไฟฟ้า	247,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
32	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านพรุ้ง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรู 6 นิ้ว(150 มม.) ลึก 80 เมตร หรือต้องได้ปริมาณ น้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.พร้อมเทคอนกรีตบริเวณปากบ่อขนาดกว้าง 1.50 x 1.50 เมตร ทน0.15 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซีเมนต์ 2 แรงม้า และตู้ควบคุมไฟฟ้า	247,900 (เงินสะสม)	1 ม.ค.68	31 พ.ค.68	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างเป็นการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
	รวม		12,616,600				6,956,800		

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายเจริญวิทย์ - แม่ไม้ตาปี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-047 สายแยกบ้านนายเจริญวิทย์ สิ่งชะเสขา - แม่ไม้ตาปี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลคูสิด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,910.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,550 ตารางเมตร	6,832,500 (อุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมฯ)	1 ต.ค.68	31 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	637,200	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกวัดวังบุญเลิศ - แยก ทล.41 หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-024 สายแยกวัดวังบุญเลิศ แยก ทล.41 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกา ตำบลคูสิด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอลำพอง จ.ลำพูน นครศรีธรรมราช	495,000 (อุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมฯ)	1 ต.ค.68	31 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	412,000	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41 - แยกบ้านนายพัน รักวังต.ต้นนพ) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-018 สายแยก ทล.41 - บ้านนายพัน รักวังต.ต้นนพ) หมู่ที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ ตำบลคูสิด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอลำพอง จ.ลำพูน นครศรีธรรมราช	495,000 (อุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมฯ)	1 ต.ค.68	31 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	412,000	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย(ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงเรียนพรณราชลเขต - บ้านด่านปรีง หมู่ที่ 11 ตำบลปรีง 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-046 สายแยกโรงเรียนพรณราชลเขต - บ้านด่านปรีง หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลคูสิด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอถ้ำพระนรา จังหวัด นครศรีธรรมราช	495,000	1 ต.ค.68	31 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	412,000	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าโรงเรียนวัดสวนพิกุล - บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-044 สายแยกหน้าโรงเรียนวัดสวนพิกุล - บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 6 บ้านสวนพิกุล ตำบลคูสิด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอถ้ำพระนรา จังหวัด นครศรีธรรมราช	495,000	1 ต.ค.68	31 ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	412,000	ไม่มี	ไม่มี
		รวม	8,812,500				2,285,200		

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน รัักษาค่าความสงบภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการตามโครงการ	22,500	1 มี.ค.69	31 มี.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยา พื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	ดำเนินการตามโครงการ	50,000	1 ต.ค.68	31 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-		
3	โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ดำเนินการตามโครงการ	150,000	1 ม.ค.69	31 ก.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-		
	รวม		222,500				-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี โรงเรียนบ้านพรุ้ง	จัดกิจกรรมต่างๆ และมอบ ประกาศนียบัตรให้นักเรียน	25,000	1 มี.ค.69	31 มี.ค.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้นำดำเนินการ	10,400	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมตามโครงการ	200,000	1 ม.ค.69	31 ม.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้นำดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรสังกัดกองการศึกษา	จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพฯ	40,000	1 ม.ค.69	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้นำดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ต่างๆ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาด้าน ต่างๆ	666,340	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้นำดำเนินการ	141,750	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการอาหารเสริม(นม)	จัดหาอาหารเสริมนมให้แก่วรรณ และ ศพด.	1,189,134	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้นำดำเนินการ	303,227	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเกาะขี้ขี้	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน	1,535,600	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้นำดำเนินการ	776,600	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพรุ้ง	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน	253,800	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้นำดำเนินการ	136,620	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
8	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนพรหมราชเขต	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน	383,400	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	179,550	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังรัฐญาติ	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน	633,600	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	314,314	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสวนพิบูล	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน	318,600	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	140,400	ไม่มี	ไม่มี
	รวม		5,245,474				2,002,861		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	เริ่มต้น				
1	โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one ศูนย์เพื่อนใจในชุมชน หมู่บ้าน ชุมชนระดมหมอยุติงอุบลรัตน์ราชภัฏชัยสุนทรมหาวิทยาลัย	ดำเนินการตามโครงการ	50,000	1 ม.ค.69	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการณรงค์และป้องกันโรคไข้สุญซ่า	ดำเนินการตามโครงการ	40,000	1 ม.ค.69	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการณรงค์และป้องกันโรคไข้สุญซ่า	ดำเนินการตามโครงการ	120,000	1 ม.ค.69	31 พ.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์อัครราชกุมารีสำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นขยะเบียดสัตว์	ดำเนินการตามโครงการ	20,000	1 ม.ค.69	30 เม.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์อัครราชกุมารีสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(จิตวิศกรรม)	ดำเนินการตามโครงการ	100,000	1 เม.ย.69	30 มิ.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	82,110	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์อัครราชกุมารี	ดำเนินการตามโครงการ	40,000	1 ม.ค.69	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์	ดำเนินการตามโครงการ	40,000	1 ม.ค.69	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาของกำกับการส่วนตำบลสุคีติ	ดำเนินการตามโครงการ	50,000	1 ม.ค.69	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
		รวม	460,000				82,110		

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	เริ่มต้น				
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี	ดำเนินการตามโครงการ	10,000	1 ม.ค.69	31 มี.ค.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	2,955	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ	ดำเนินการตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.68	31 ก.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
	รวม		40,000				2,955		

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	เริ่มต้น				
1	โครงการสนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพ	10,558,800	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	4,872,700	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการสนับสนุนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพ	2,980,800	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	1,390,600	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอชไอวี	จ่ายเบี้ยยังชีพ	90,000	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	36,000	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	จ่ายเงินสมทบกองทุน	180,000	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	180,000	ไม่มี	ไม่มี
	รวม		13,809,600				6,479,300		

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	ดำเนินการตามโครงการ	150,000	1 มี.ค.69	31 พ.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการส่งนักกีฬานักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม	40,000	1 ต.ค.8	31 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
	รวม		190,000				-		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการงานประเพณีปอกเปลือกเดือน	จัดกิจกรรม	30,000	1 เม.ย.69	30 เม.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมฯ	20,000	1ก.ค.69	31 ก.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ	ดำเนินการตามโครงการ	55,000	1 ก.ย.69	31 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรม	150,000	1 พ.ย.68	30 พ.ย.68	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	107,534	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบของ จ.นครศรีธรรมราช	อุดหนุนงบประมาณให้ทำการอำเภออำเภอรามรา	20,000	1 ก.ย.69	31 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการส่งเสริมประเพณีมีฆาตบุษย์แห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภออำเภอรามรา	อุดหนุนงบประมาณให้ทำการอำเภออำเภอรามรา	25,000	1 ก.พ.69	31 มี.ค.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	25,000	ไม่มี	ไม่มี
	รวม		300,000				132,534		

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์..

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ตุลิตกับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	5,000	1 ต.ค.68	31 ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
	รวม		5,000				-		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวนงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2569	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อ.ถ้าพรรณรา ดำเนินโครงการ	35,000	1มิ.ย.69	30 มิ.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อ.ถ้าพรรณรา ดำเนินโครงการ	25,000	1ธ.ค.68	31 ธ.ค.68	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อ.ถ้าพรรณรา ดำเนินโครงการ	35,000	1ก.ค.69	31 ก.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 94 พรรษา 12 สิงหาคม 2569	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อ.ถ้าพรรณรา ดำเนินโครงการ	35,000	1ส.ค.69	31ส.ค.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2568	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง อ.ถ้าพรรณรา ดำเนินโครงการ	15,000	1 ต.ค.68	31 ต.ค.68	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,000	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
6	โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	อุดหนุนงบประมาณให้กับทำ การปกครอง อ.ถ้าพรธรมรา	25,000	1 ต.ค.68	31 ต.ค.68	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วัยเปี่ยมพรายาษา วันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	80,000	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	18,948	ไม่มี	ไม่มี
8	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต่างๆ	550,000	1 ต.ค.78	39 ก.พ.69	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	443,343	ไม่มี	ไม่มี
		รวม	800,000				477,291		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิต)	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการอบรมรมกนิบาลและจริยธรรมสำหรับ ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จัดกิจกรรม	15,000	1 ต.ค.67	29 เม.ย.68	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่มี	ไม่มี
	รวม		15,000				-		

การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.ดุสิต มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 มีจำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 23,786,574 บาท ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 9,177,142 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	การก่อหนี้ผูกพัน /ลงนามตามสัญญา	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร	5	2,639,000	0	0
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	29	20,367,574	13	8,387,226
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	395,000	3	151,482
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	35,000	0	0
การบริหารจัดการองค์กร	7	350,000	3	638,434
รวม	51	23,786,574	19	9,177,142

3.งบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ตุลาคม 2568 -31 มีนาคม 2569)

รายจ่ายด้านบุคลากร	5,549,372.01	บาท
รายจ่ายด้านการฝึกอบรม	81,420	บาท
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	22,964.16	บาท
ค่าวัสดุ	687,474.63	บาท
ค่าใช้สอย	1,586,516.12	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	1,472,890.48	บาท
ค่าใช้สอยอื่น	-	บาท
ค่าตอบแทน	592,824.46	บาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	บาท
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน	-	บาท
หนี้สงสัยจะสูญ	-	บาท
ต้นทุนการกู้ยืม	-	บาท
ค่าจำหน่ายการขายสินทรัพย์	-	บาท
ขาดทุนการประเมินราคาและด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	-	บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	263,853.80	บาท
ค่าใช้จ่ายรับโอนหนี้สิน	-	บาท
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	374,193	บาท
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	-	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	181,700	บาท
รายการพิเศษหลังหักภาษี	-	บาท
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	6,300,378	บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	บาท
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	2,417,907.68	บาท
รวม	19,531,495.01	บาท

งบประมาณรายรับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

รายได้ภาษีป้าย	87,819	บาท
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,032.89	บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	1008.80	บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300	บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	-	บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	220	บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	27,000	บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	7,732	บาท
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	8,362	บาท
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ	15,000	บาท
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	719.70	บาท
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	บาท
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	997.26	บาท
รายได้จากประปา	590,473	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	-	บาท
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	-	บาท
รายได้ค่าขายเวชภัณฑ์	-	บาท
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	บาท
รายได้ภาษีรถยนต์	264,850.11	บาท
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	7,588,201.71	บาท
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	1,910,689.66	บาท
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,902.97	บาท
รายได้ภาษีสรรพสามิต	2,873,094.43	บาท
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	45,335.52	บาท
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,306.02	บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	106,586	บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2020	บาท
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		บาท
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,896,000	บาท
รวม	19,501,651.12	บาท

ปัญหาและอุปสรรค

๑) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 คูสิตจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละขอโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ
 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปได้รับงบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถ
 ดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติได้ทันในปีงบประมาณ บางโครงการต้องตกไปและบางโครงการต้องทำกันเงินไว้
 เพื่อดำเนินการต่อไป

3) การเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของประเทศที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

๔) การของบประมาณเงินอุดหนุนของประชาชนยังขาดความเข้าใจในระเบียบฯ

๕) การขาดบุคลากรบางตำแหน่งทำให้การดำเนินงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
 ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

2) เห็นควรพิจารณาปรับดำเนินโครงการเมื่อมีงบประมาณอุดหนุนทั่วไปเข้ามา และงบประมาณที่ อดต.
 จัดเก็บเอง


3) ควรกำชับเจ้าหน้าที่รับดำเนินโครงการเมื่อมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ

ข. ผลการดำเนินงานอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2569 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดุสิต

วันที่ 31 มีนาคม 2569 อบต.ดุสิต จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลดุสิต ครั้งที่ 1/2569 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดุสิต โดย นายศรายุทธ์ ชัยเพชร รองนายก อบต.ดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้ นายไพสิทธิ์ ไชยรัตน์ ผ.ช.นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการให้ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดุสิต โดยคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลดุสิตที่มาประชุม ซึ่งผลการคัดเลือกมีผู้ได้รับเห็นชอบเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดุสิต จำนวน 21 คน

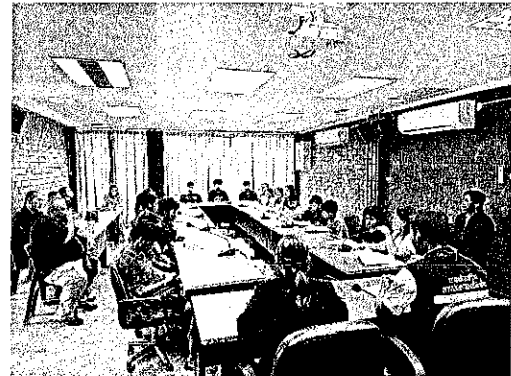

2. โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568


วันที่ 31 มีนาคม 2569 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรวง สังกัดกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม อบต.ดู่สิต ได้ดำเนินโครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมีอบจ.บึงนารางให้การสนับสนุน โดยมอบงบประมาณให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ในระดับชั้นอนุบาล 2 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนในการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

บรรยากาศภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก นายทักษิณ กามณี นายก อบต.ดู่สิต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร พร้อมให้อวาทแก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ได้แก่ นายศรยุทธ์ ชัยเพชร รองนายก อบต. ดู่สิต นายโกมล เขียมสกุลเลขานุการนายก อบต. ดู่สิต นางกนกวรรณ สุรภักดี ปลัด อบต. ดู่สิต นางแสงเดือน เกื้อกุลบุตร นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา นายไพศาล ทองเจริญ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด นายจรูญ จันทร์พิบูลย์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตลอดจนผู้ปกครองทุกคน



๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด



วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีตำบลคูสิด โดยมี นายทักษิณ กามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด เป็นประธานในพิธีเปิด นางกนกวรรณ สุรภักดิ์ ปลัด อบต.คูสิด ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ ตามโครงการฯ ได้จัดฝึกอบรมเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้

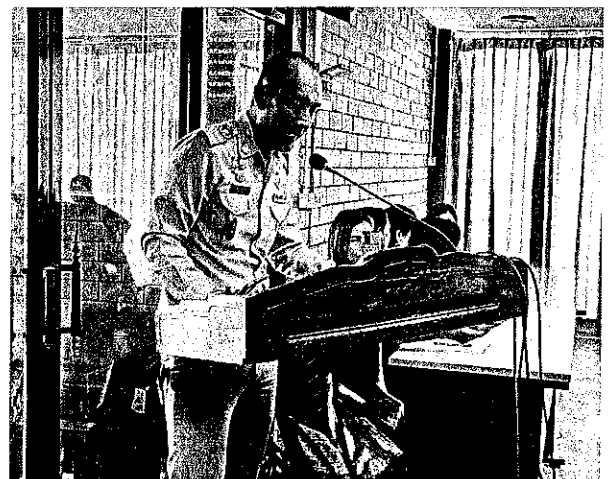

4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


29 มีนาคม 2569 พิธีเปิด “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” โดย นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภณ นายอำเภอถ้ำพระมรธา ให้เกียรติเป็นประธาน และนายทักษิณ กามูณี นายก อบต.ดูลิต กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดูลิต ซึ่งตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อบต.ดูลิต และท้องถิ่น ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย ฟุ้งใหญ่ นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และอาสาปศุสัตว์จาก อบต.ดูลิต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลดูลิต ในวันที่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป



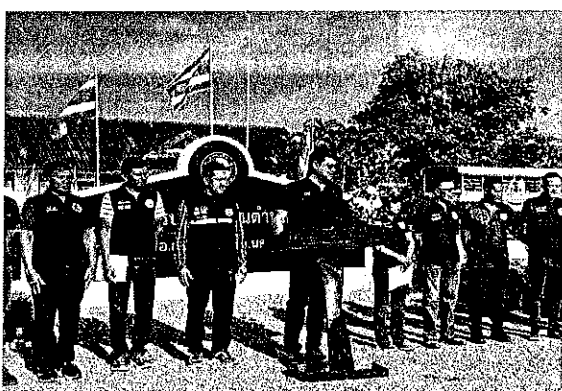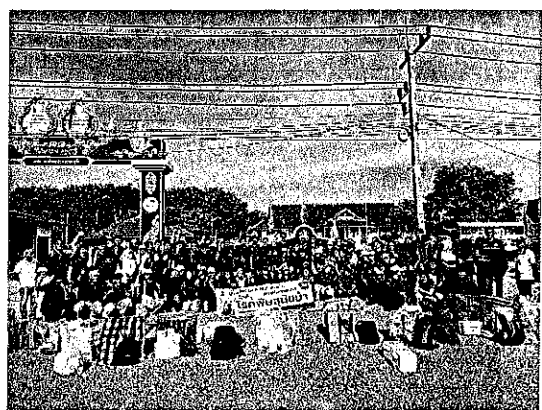

5. โครงการแข่งขันกีฬาตำบล


27 เมษายน 2569 พิธีเปิด - พิธีปิด ในการแข่งขันกีฬาตำบล “ดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 23/2569” โดย นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภานายอำเภออําเภอดําพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายทักษิณ กามูณี นายก อบต.ดุสิต ประธานในพิธีปิด และนางกนกวรรณ สุรภักดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.โรงเรียน สมาชิกสภา อบต.ดุสิต กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลดุสิต ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประธานศูนย์กีฬาตำบลดุสิต และนักกีฬา เข้าร่วมพิธี ดังกล่าว

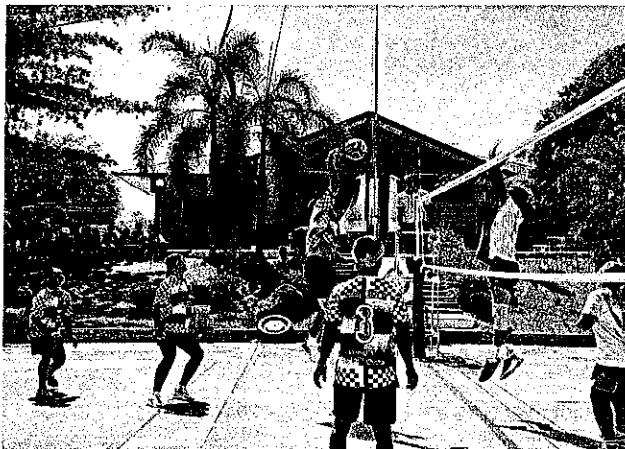



6. การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน



นายก อบต.ดุสิต มอบหมายนายศรายุทธ ชัยเพชร รองนายก อบต.ดุสิต และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดุสิต ลงพื้นที่พร้อมสมาชิกสภา อบต.ดุสิต ท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย พร้อมมอบวัสดุเพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย(บางส่วน) จากเหตุวาตภัยในพื้นที่ ม.2,5,7

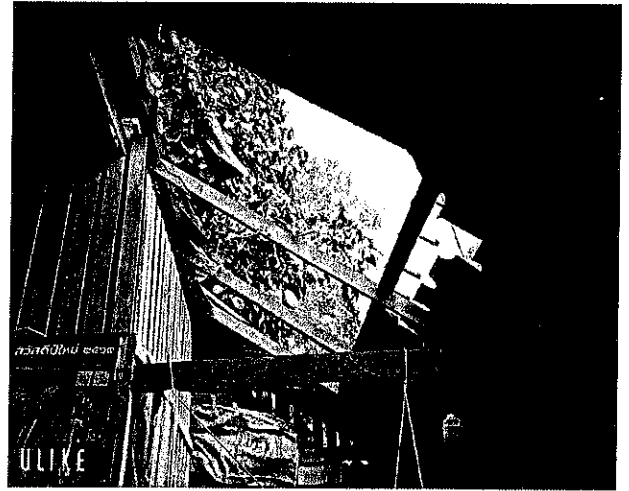

๗. โครงการจัดงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี ๒๕๖๙




วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ร่วมกับ วัดวังรีบุญเลิศ จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี ๒๕๖๙ ณ วัดวังรีบุญเลิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูสิต โดย นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภานายอำเภอถ้ำพรรณรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายทักษิณ กามูณี นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูสิตเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งในงานมีพิธีทางศาสนา การฟ้งเทศน์ฟ้งธรรม สรงน้ำพระพุทธรูปพร้อมทั้งการสรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ รูปเหมือนหลวงพ่อเลื่อน รูปเหมือนหลวงปู่ทวด สรงน้ำพระครูประจักษ์ธรรมวาที (พระอาจารย์สุชาติ) เจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคูสิต มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้



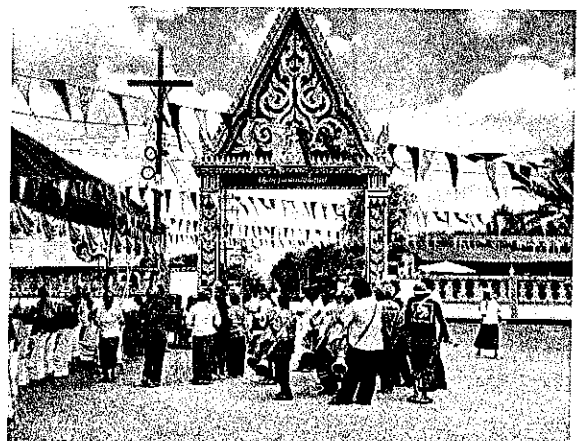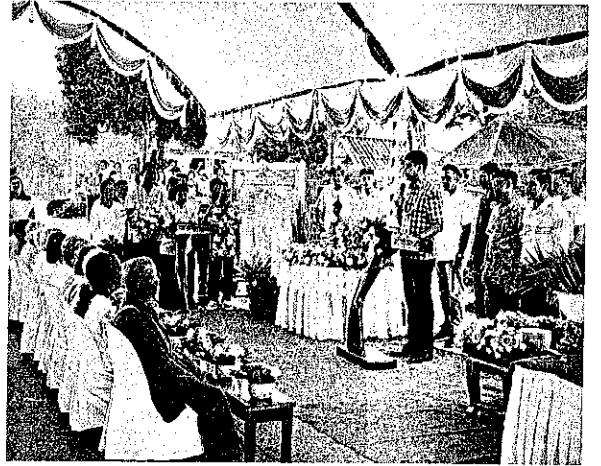


8. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2569

วันนี้ 10 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภาน นายอำเภอถ้ำพรรณรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2569 โดย นายทักษิณ กามูณี นายก อบต.คูสิต/ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผกก.สภ.ถ้ำพรรณรา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลคูสิต และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ โดยจะมีการจัดตั้ง “ด่านชุมชน” พร้อมจุดบริการประชาชน ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.คูสิต ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2569 โดย บูรณาการร่วมกับ สภ.ถ้ำพรรณรา สนง.สาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

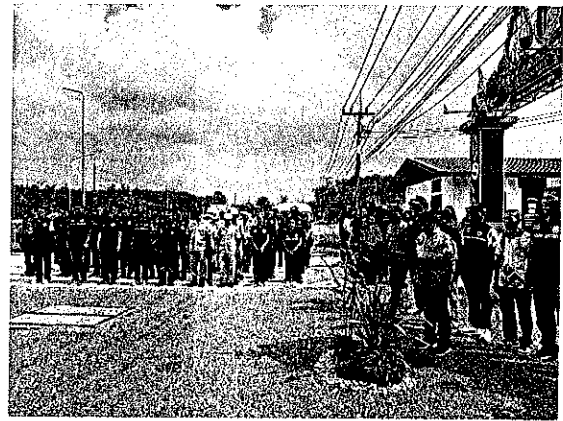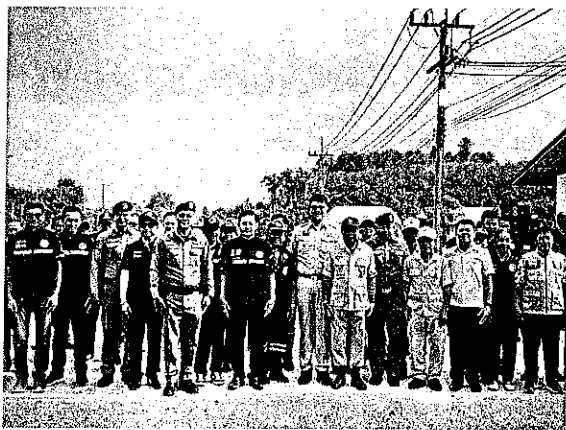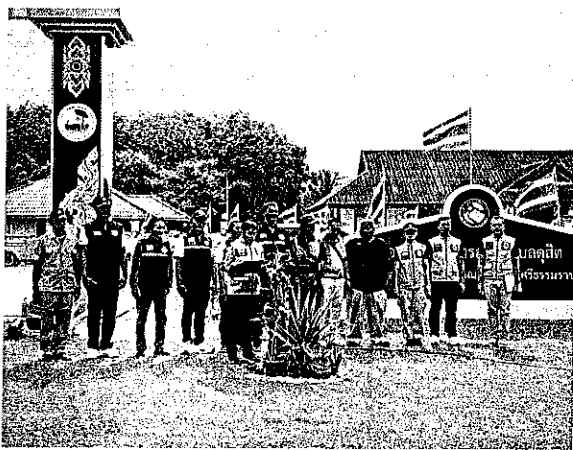

9. ประชุมผู้บริหารฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำเดือน

วันนี้ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. นายทักษิณ กามูณี นายก อบต.ดลสิต เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569 โดยที่ประชุมได้ร่วมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ ติดตามผลการดำเนินงานในงานประจำและการดำเนินการตามหนังสือสั่งการสำคัญต่าง ๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา เน้นย้ำถึงความร่วมมือภายในองค์กร ทั้งในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การบริการและการช่วยเหลือประชาชน

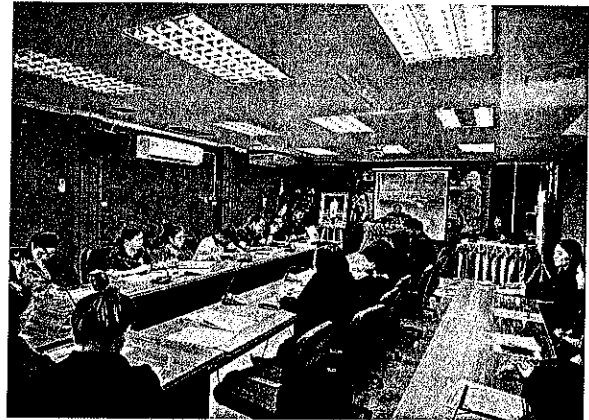

10.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรวง (อบต.ตุลิต) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรวง (อบต.ตุลิต) ในวันและเวลา ราชการ หรือ โทร. 080- 6970119 , 061-1870174



ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2569
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านพรวง



เตรียมอนุบาล

- อายุครบ 2 ปีขึ้นไป
- เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2568 - 16 พฤษภาคม 2567

อนุบาล 1

- อายุ 3 ปีบริบูรณ์
- เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2565 - 16 พฤษภาคม 2566

อนุบาล 2

- อายุ 4 ปีบริบูรณ์
- เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2564 - 16 พฤษภาคม 2565


เอกสารที่ใช้ในเอกสารสมัคร

- ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรวง
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนานิติบัตรประชาชน บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ
- ตอของนำเด็กมาแสดงตัวในวันขึ้นใบสมัคร

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต หรือผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต หรือแจ้งผ่านผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิตทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายทักษิณ กามูณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
